


Proceslinje tidsplanmodel																																				
VVM	Vurdering af Virkningerne på Miljøet																																			
MV	Miljøvurdering																																			
LP	Lokalplan																																			
KP	Kommuneplan																																			
KPT	Kommuneplantillæg																																			
TP	Temaplan																																			
		Uge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>0. Forberedende arbejde i kommunen</b>																																				
	Overvejelser omkring potentialer og politiske ønsker																																			
	Beslutning om udarbejdelse af planforslag (KP eller TP)																																			
<b>I. Udpegning af vindmølleområder</b>																																				
<b>Idéfase og scoping</b>																																				
	Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev																																			
	Debatoplæg på udvalgsmøde(r)																																			
	Debatoplæg på byrådsmøde																																			
	Indkaldelse af idéer og forslag																																			
	Høring af berørte myndigheder																																			
	Borgerinddragelse (evt. borgermøde(r))																																			
	Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg																																			
	Beslutning om igangsætning af planforslag og MV																																			
<b>Udarbejdelse af planforslag, inklusive miljørapport med MV</b>																																				
	Udarbejdelse af planforslag																																			
	Udarbejdelse af miljørapport																																			
	Intern høring af planerne																																			
	Opsamling på intern høring og sagsfremstilling til udvalg og byråd																																			
	Godkendelse af planforslag på udvalgsmøde(r)																																			
	Godkendelse af planforslag i byråd																																			
<b>Offentlighedsfase</b>																																				
	Offentliggørelse af planforslag, inkl. miljørapport med MV																																			
	Offentlig høring (min 8 uger)																																			
	Borgerinddragelse (evt. borgermøde(r))																																			
	Sammenfattende redegørelse (indsigelser og hørings svar)																																			
	Stillingtagen til indsigelser																																			
	Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase																																			
	Plan til endelig vedtagelse på udvalgsmøde(r)																																			
	Plan til endelig vedtagelse på byrådsmøde																																			
	Offentliggørelse af endelig vedtaget plan																																			
	Klagefrist (4 uger)																																			
<b>II. Konkret ansøgt projekt i vindmølleområde</b>																																				
	Ansøgning om konkret projekt fra bygherre																																			
	Afgørelse om VVM-pligt																																			
	Klagefrist (4 uger)																																			
<b>Idéfase og scoping</b>																																				
	Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev																																			
	Debatoplæg på udvalgsmøde(r)																																			
	Debatoplæg på byrådsmøde																																			
	Indkaldelse af ideer og forslag																																			
	Høring af berørte myndigheder																																			
	Borgerinddragelse (evt. borgermøde(r))																																			
	Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg																																			
	Beslutning om igangsætning af planforslag og VVM																																			
<b>Udarbejdelse af planforslag, KPT (inkl. miljørapport med VVM og MV) og LP</b>																																				
	Udarbejdelse af KPT med VVM og MV																																			
	Udarbejdelse af LP og KPT																																			
	Intern høring af planerne																																			
	Opsamling på intern høring og sagsfremstilling til udvalg og byråd																																			
	Planforslag på udvalgsmøde(r)																																			
	Planforslag på byrådsmøde																																			
<b>Offentlighedsfase</b>																																				
	Offentliggørelse af planforslag, KPT (inkl. miljørapport med VVM og MV) og LP																																			
	Offentlig høring af planforslag (min. 8 uger)																																			
	Borgerinddragelse (borgemøde(r) (obligatorisk i flg. VE-lov))																																			
	Behandling af indsigelser til planforslag																																			
	Sammenfattede redegørelse (indsigelser og hørings svar)																																			
	Stillingtagen til indsigelser																																			
	Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase																																			
	Udarbejdelse af endelig plan																																			
	Plan til endelig vedtagelse på udvalgsmøde(r)																																			
	Plan til endelig vedtagelse på byrådsmøde																																			
	Offentliggørelse af endelig vedtaget plan																																			
	Udarbejdelse og udstedelse af VVM-tilladelse																																			
	Klagefrist for VVM (4 uger)																																			
	Klagefrist for LP (4 uger)																																			
	Klagefrist for KPT (4 uger)																																			
<b>III. Opførelse af vindmøllerne</b>																																				
	Bestilling og levering af vindmøller																																			
	Opførelse																																			
	Nettilslutning																																			

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98



99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

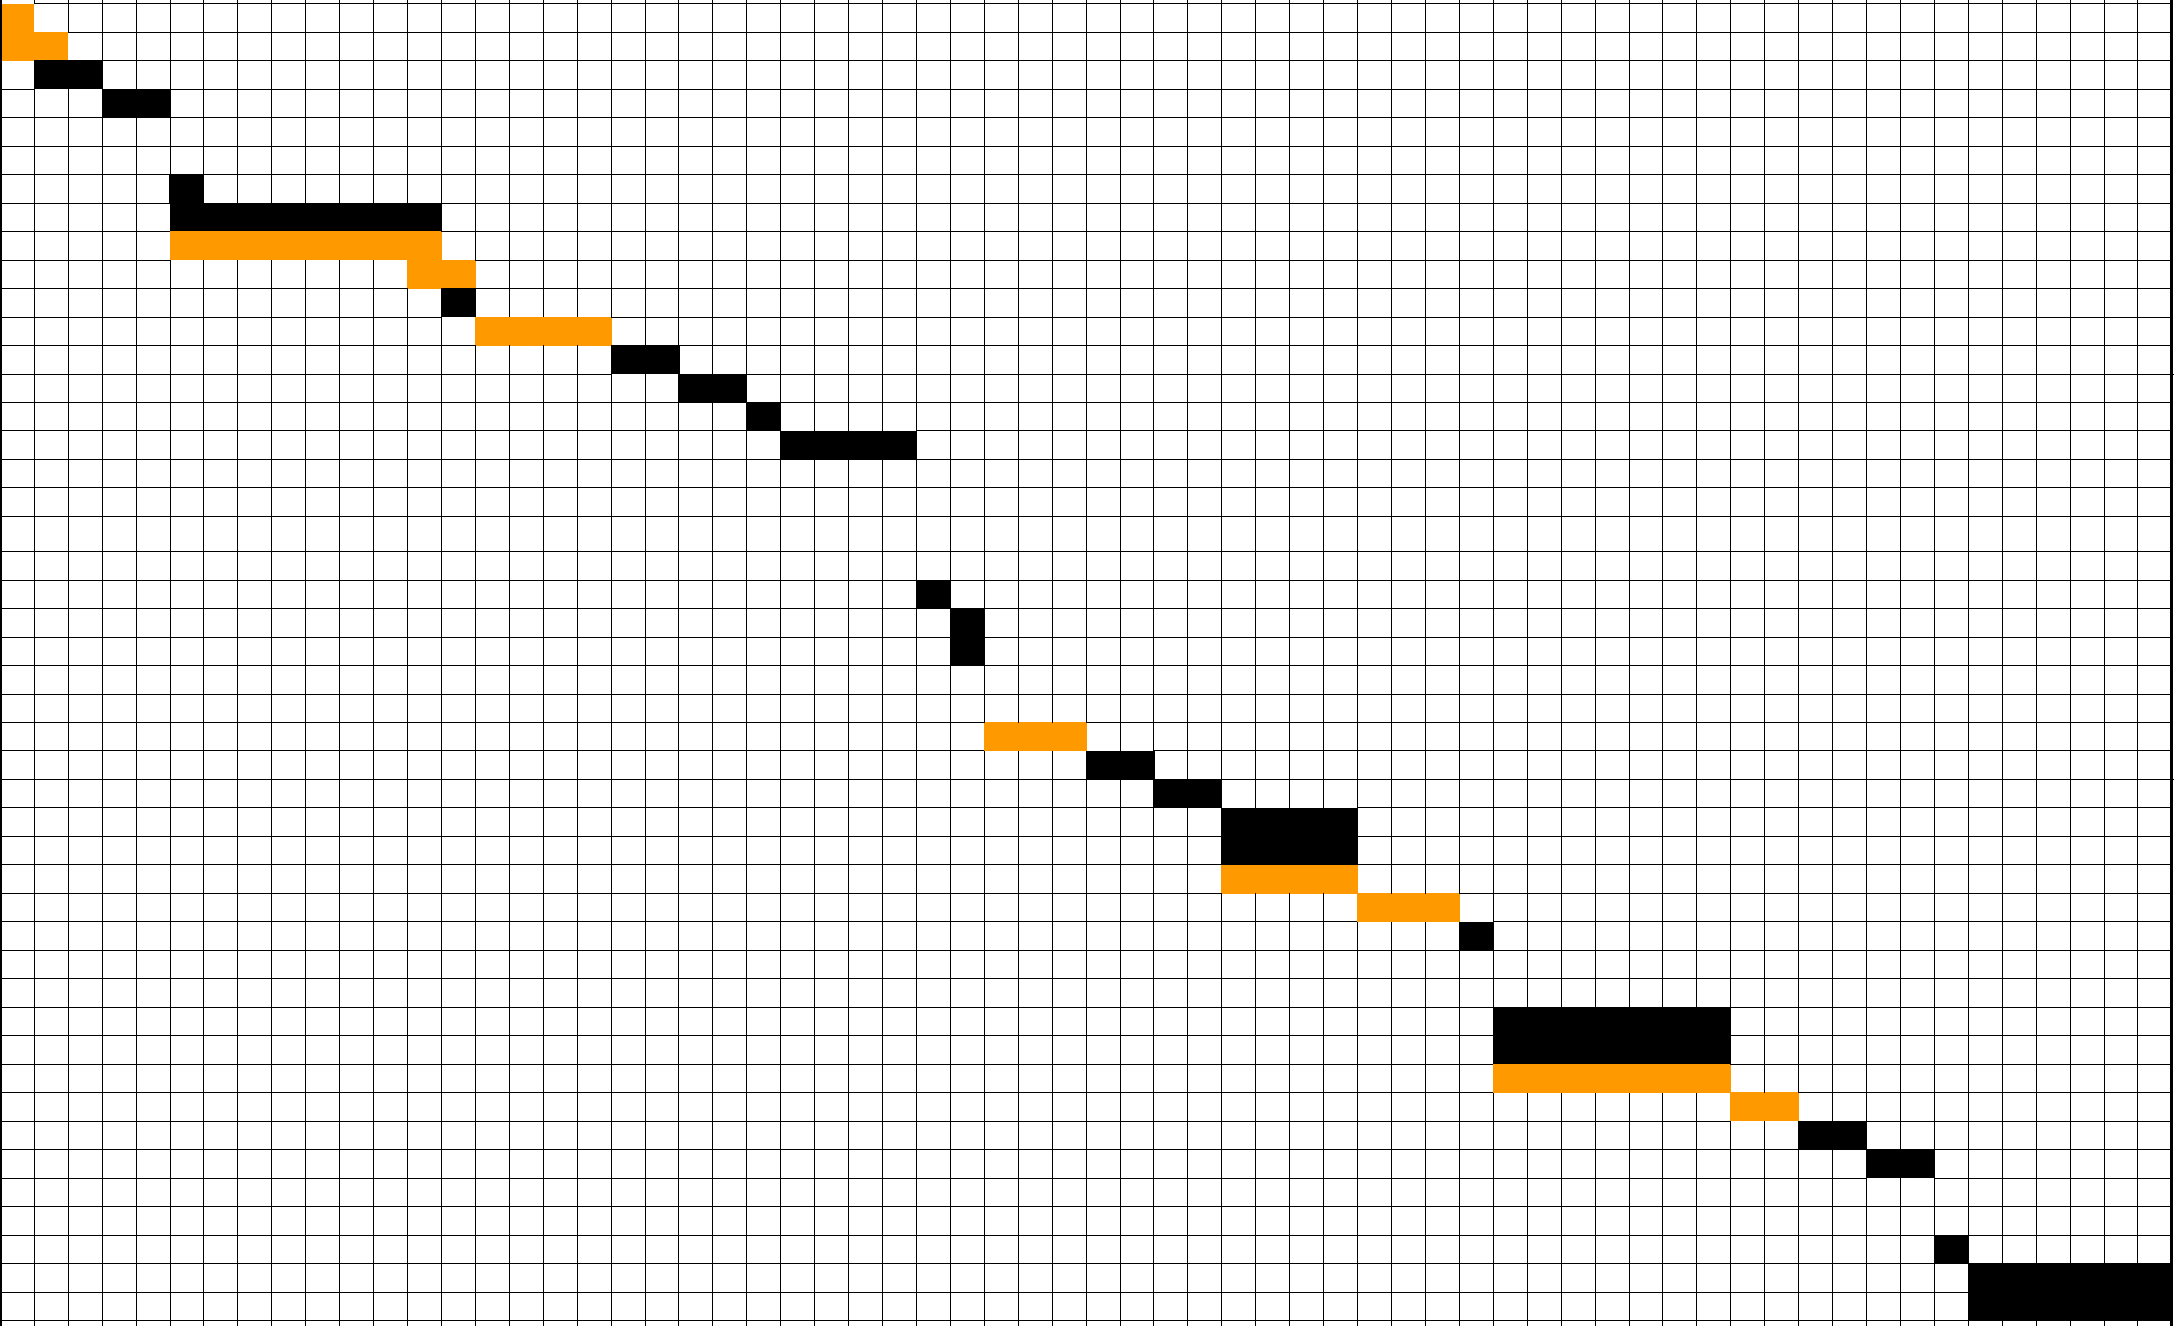
